

# CARTA EUROPEIA DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO ALTO MINHO



## 2ª Reunião do Fórum Reavaliação (online)

TURISMO DE  
PORTUGAL 

  
Valorizar



cim alto minho  
comunidade intermunicipal do minho-lima

9 e 10 de Fevereiro de 2021

**ALTO  
MINHO**  
CARTA EUROPEIA DE TURISMO SUSTENTÁVEL

 **EUROPARC**  
Turismo Sustentável  
em Áreas Protegidas



**EUROPARC**  
Turismo Sustentável  
em Áreas Protegidas

**ALTO  
MINHO**  
CARTA EUROPEIA DE TURISMO SUSTENTÁVEL

# Sessão Plenária

## Sessão de Abertura

*Bruno Caldas, CIM AM*



# Dia 1 Programa

<b>Sessão plenária</b>		
09h00	Abertura - CIM Alto Minho	15'
09h15	Apresentação do ponto situação CETS, nova estratégia e iniciativas CETS - Teresa Pastor, CETS EUROPARC	20'
09h35	Debate	15'
09h50	Apresentar e validar o documento de avaliação do PA 2015-2019 (+2020) - Paulo Castro, Ponto Natura	45'
10h35	Debate	15'
10h50	Pausa	15'
11h05	Constituição dos grupos de trabalho e explicação da metodologia de trabalho - Paulo Castro, Ponto Natura	15'
<b>Sessões paralelas de grupos de trabalho temáticos</b>		
11h20	Grupos de Trabalho: Apresentar, discutir e validar as ofertas da nova Estratégia e Plano de Ação para o próximo PA 2021-2024	60'
<b>Sessão plenária</b>		
12h20	Resumo do dia 1	10'
12h30	Fim dos trabalhos	0'



# Dia 2 Programa (1/2)

## CETS I

<b>Sessão plenária</b>		
9h00	Apresentar em plenário os resultados das sessões do dia 1: ofertas da nova Estratégia e Plano de Ação	10'
09h10	Debate	10'
9h20	Constituição dos grupos de trabalho e explicação da metodologia de trabalho - Paulo Castro, Ponto Natura	15'
<b>Sessões paralelas de grupos de trabalho temáticos</b>		
9h35	Grupos de Trabalho: Apresentar e validar as Áreas Temáticas para o próximo PA 2021-2024 e identificar os respetivos curadores e potenciais interessados na participação das reuniões temáticas	60'
10h35	Pausa	15'



## Dia 2 Programa (2/2)

### CETS II

	<b>Sessão plenária</b>	
10h50	Apresentar a situação da CETS II em Espanha e a estratégia de ecoturismo – Amanda Guzmán, Asociación Ecoturismo España	25'
11h15	Debate	15'
11h30	Apresentação dos compromissos específicos ao território CETS II AM - Isabel Sousa, Elos da Montanha	10'
11h40	Debate	15'
11h55	Apresentação dos empresários CETS II AM e sua visibilidade nas iniciativas EUROPARC – Consórcio	35'
12h30	Próximos passos e encerramento dos trabalhos - CIM Alto Minho	10'
12h40	Fim dos trabalhos do Fórum	0'



# Informações gerais

- **Este evento está a ser gravado** - ligue ou desligue a sua câmara de acordo com a sua preferência quanto ao seu anonimato na barra inferior da tela.
- Pode **aumentar ou diminuir o tamanho da imagem** na coluna à esquerda da tela nas teclas + e -
- **Desligue o microfone** e ligue-o apenas se pretender falar na barra inferior da tela.
- **Para falar** levante a “mão virtual” na barra inferior da tela em “reações” ou junto do seu nome em participantes na coluna à direita e aguarde as instruções do moderador.
- Para perguntas e comentários, use o **Cisco Webex® Bate-papo** no lado direito da tela.



**EUROPARC**  
Turismo Sustentável  
em Áreas Protegidas

**ALTO  
MINHO**  
CARTA EUROPEIA DE TURISMO SUSTENTÁVEL

# Sessão Plenária


## Ponto de situação CETS, nova estratégia e iniciativas CETS


*Teresa Pastor, CETS EUROPARC*



# Debate

Durante o debate, gostaríamos de contar com a sua participação.

- **Intervenção:** levante a mão virtual  para pedir para falar e aguarde as instruções do moderador.
- **Chat:** Escreva a sua pergunta no Cisco Webex® Bato-papo. O moderador fará uma seleção entre todas as perguntas feitas.

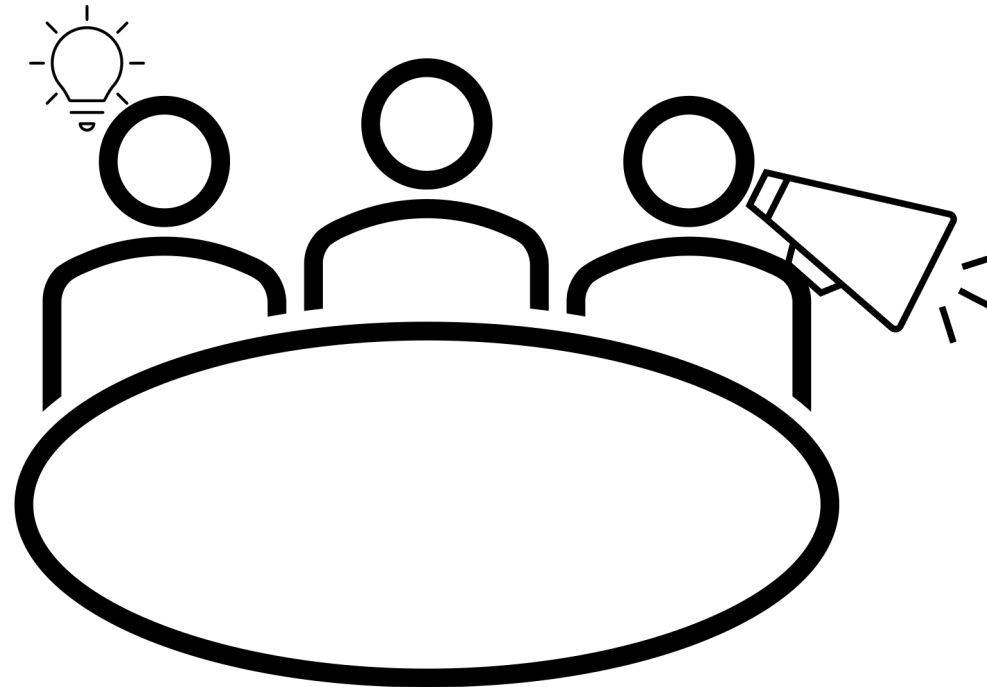





**EUROPARC**  
Turismo Sustentável  
em Áreas Protegidas

**ALTO  
MINHO**  
CARTA EUROPEIA DE TURISMO SUSTENTÁVEL

# Sessão Plenária

## **Apresentação e validação: Documento de avaliação do PA 2015-2019 (+2020)**

*Paulo Castro, Ponto Natura*



# Enquadramento CETS Alto Minho (1/4)



- A CETS é um galardão atribuído pela **Federação EUROPARC** aos territórios com áreas protegidas e/ou classificadas que se comprometem, voluntariamente, a trabalhar com os atores locais no desenvolvimento de um destino de turismo de natureza baseado em princípios de sustentabilidade



**EUROPARC**  
Turismo Sustentável  
em Áreas Protegidas

**ALTO  
MINHO**  
CARTA EUROPEIA DE TURISMO SUSTENTÁVEL

## Enquadramento CETS Alto Minho (2/4)


- Em 2014 a CIM AM apresentou candidatura do território do Alto Minho à Carta Europeia de Turismo Sustentável, recebendo o galardão pela Federação EUROPARC em 2015.
- A CIM é a entidade detentora/gestora da CETS do Alto Minho.





# Enquadramento CETS Alto Minho (3/4)

- A CETS do Alto Minho inclui a **rede de áreas protegidas** (APPCB; APPLBSPA) e **classificadas** (RN2000 – 5 SIC e 1 ZPE e uma Zona Húmida da Convenção de Ramsar) que ocupam 13% do território (exceto os municípios de Mel, AV e PB)
- A candidatura tem por base um **diagnóstico** do território focado no seu turismo, uma **estratégia** de desenvolvimento turístico sustentável e o respetivo **plano de ação**

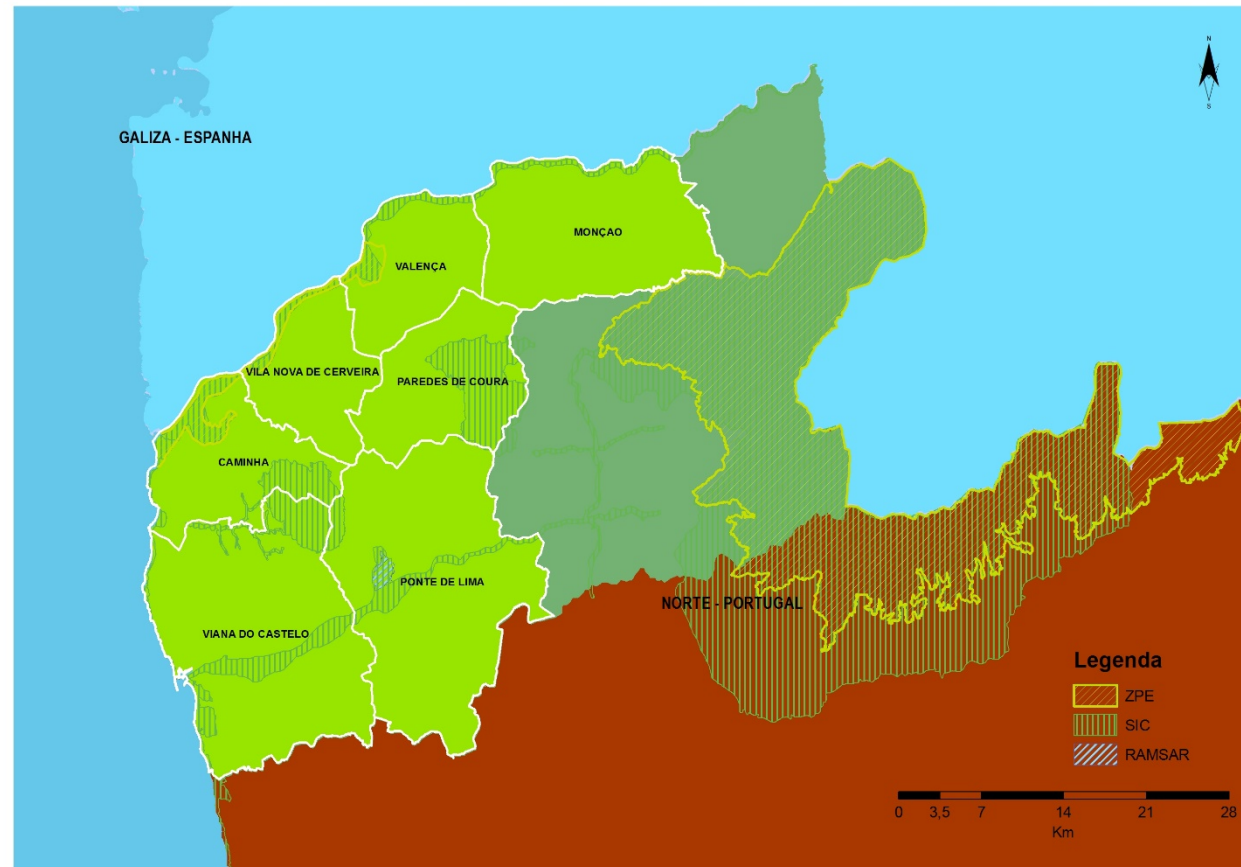



# Enquadramento CETS Alto Minho (4/4)

- O território elaborou um **Plano de Ação a cinco anos** (2015-2019) que visa o desenvolvimento do turismo no território com base nos 10 princípios de sustentabilidade da CETS
- A **Estratégia de Desenvolvimento Turístico Sustentável** atual é constituída por 4 pilares (identidade territorial, identidade visual, conhecimento e organização) e 6 ofertas diferenciadoras

## 6 ofertas diferenciadoras


1. O mar e as atividades marítimas
2. Os vales dos Rios Minho e Lima
3. Águas Bravas e desportos aquáticos
4. Montanhas
5. Património, cultura e tradições
6. Gastronomia e vinhos



# Planeamento participado na CETS do AM

A CETS do Alto Minho é constituída por dois níveis de participação:


- **Equipa Técnica de Projeto** – Pluridisciplinar e interinstitucional com técnicos de várias entidades públicas (33 elementos) e privadas (17 elementos) – Elaboração da candidatura, validação de propostas, etc.
- **Fórum Permanente de Turismo Sustentável** – Congrega todas as entidades e agentes locais interessados (públicos e privados) direta ou indiretamente ligados ao setor do turismo – Validação das opções do território apresentadas pela ETP nas diferentes fases:

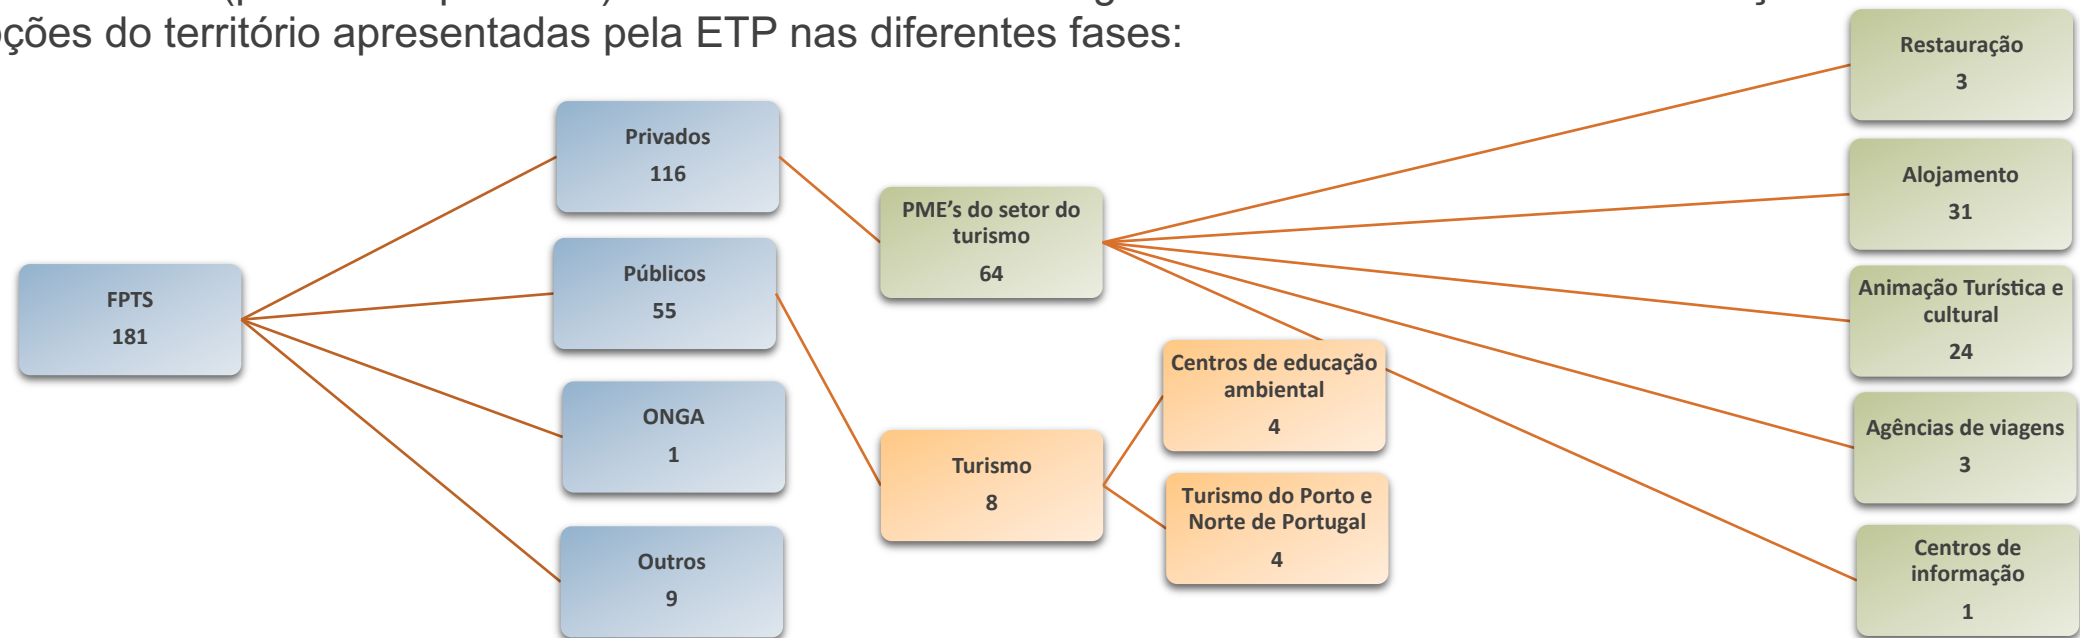



# Reavaliação da CETS do Alto Minho

- Atraso de um ano na entrega do dossier de recandidatura devido à implementação da Fase II da CETS em 2019
- Nova data limite pedida para submeter dossier: 28 de maio de 2021

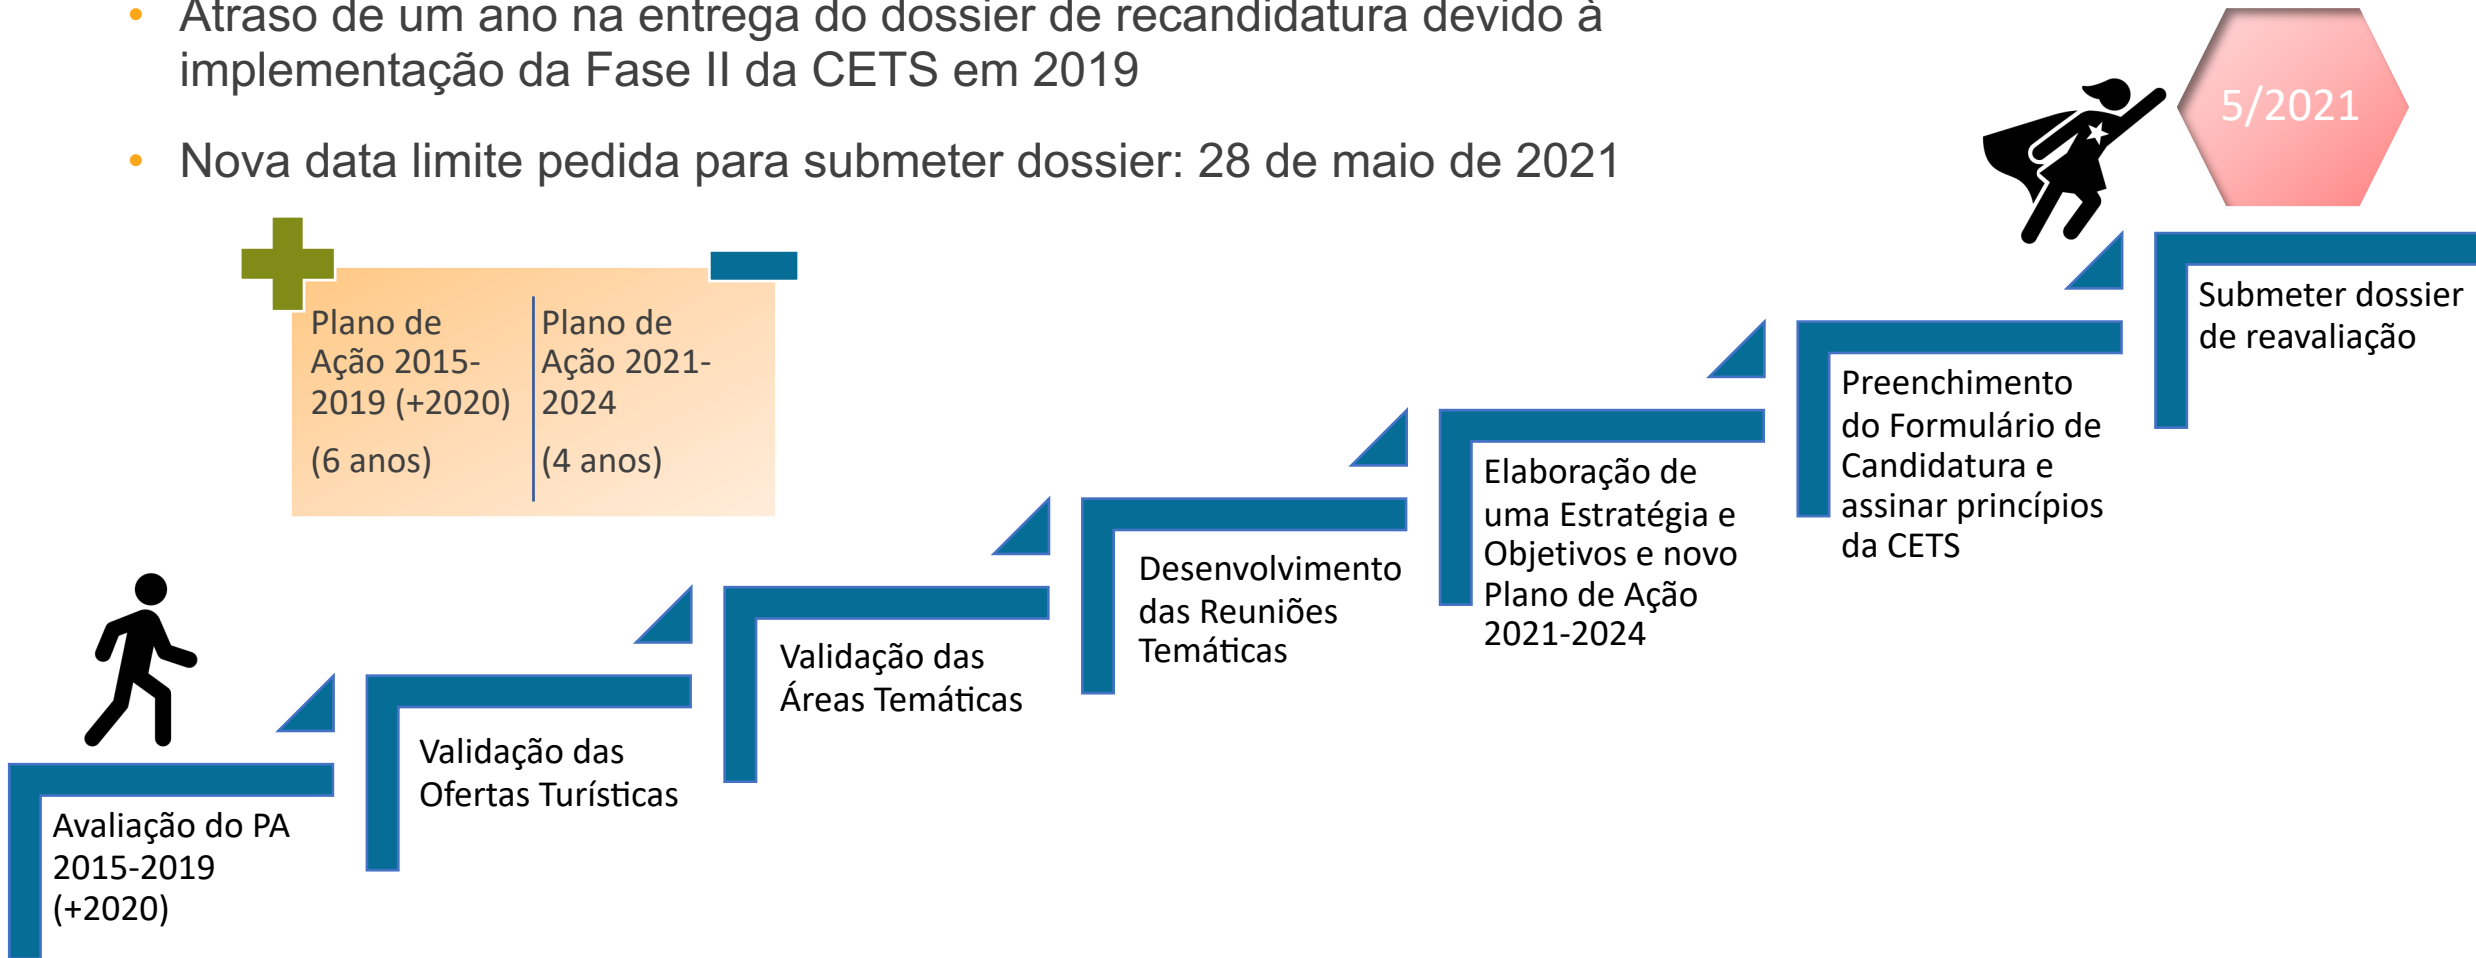



## **Apresentação e validação: Documento de avaliação do PA 2015-2019 (+2020)**

- Grau de execução física (geral, detalhado e por promotor)
- Principais conclusões
  
- Grau de execução financeira (por promotor)
- Principais conclusões
- Ações executadas não previstas no PA
  
- Recomendações da auditora
- Recomendações da PN para o próximo PA





## Grau de execução física GERAL

% EXECUÇÃO	GRAU DE EXECUÇÃO	
0%	☹️	Ação não iniciada (ANI)
1% - 50%	☹️ 😊	Ação iniciada (AI)
51% - 99%	😊 😊	Ação avançada (AA)
100%	😊	Ação finalizada (AF)

GRAU DE EXECUÇÃO	Nº DE AÇÕES	%
☹️ Ação não iniciada (ANI)	25	35
☹️ 😊 Ação iniciada (AI)	11	15
😊 😊 Ação avançada (AA)	12	17
😊 Ação finalizada (AF)	23	32
<b>TOTAL</b>	<b>71</b>	<b>100</b>

- **O grau de execução global foi de 49%**
- Grau de execução de cada ação feito com base na estimativa dada pelo promotor
- Percentagem de execução do Plano de Ação obtida através da ponderação de cada uma das categorias

$$[[ (ANI \times 0) + (AI \times 0,33) + (AA \times 0,66) + (AF \times 1) / N^{\circ} \text{ ações} ] \times 100]$$



## Grau de execução física DETALHADO 1/6

#	NOME AÇÃO	PROMOTOR PREVISTO	PROMOTOR REAL	INVEST PREVISTO	INVEST REAL	DESVIO (%)	ÂMBITO TERRITORIAL REAL	GRAU DE EXECUÇÃO
I.1	Mobilidade e acessibilidade universal	CIM Alto Minho	CIM Alto Minho	535 000€	2 757 634€	415	Território CETS do Alto Minho	☺☺
I.2	Acessibilidade e comunicação digital	CIM Alto Minho	CIM Alto Minho	175 000€	DND	0	Território CETS do Alto Minho	☹☺
I.3	Promoção da acessibilidade e mobilidade para e no território	Câmara Municipal de Viana do Castelo	Câmara Municipal de Viana do Castelo	62 500€	DND	0	Município de Viana do Castelo (centro histórico da cidade)	☹☺
I.4	Valorização da Serra de Arga	CIM Alto Minho	CIM Alto Minho, Câmara Municipal de Caminha, Ponte de Lima e Viana do Castelo	390 000€	154 000€	-61	Municípios de Caminha, Ponte de Lima, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira	☺
I.5	Rios Lima e Estorãos	Câmaras Municipais de Ponte de Lima e Viana do Castelo	Câmaras Municipais de Ponte de Lima, Viana do Castelo	704 110€	429 884€	-39	Municípios de Viana do Castelo e de Ponte de Lima	☺
I.6	Parque Cultural do Vale do Coura	Câmara Municipal de Paredes de Coura	Câmara Municipal de Paredes de Coura	105 000€	DND	0	Município de Paredes de Coura	☹☺
I.7	Rede de Castros de Viana do Castelo	Câmara Municipal de Viana do Castelo	NA	80 000€	- €	0	NA	☹
I.8	Natureza e cultura no Litoral Norte	Câmara Municipal de Viana do Castelo	Câmara Municipal de Viana do Castelo	350 000€	125 000€	-64	Município de Viana do Castelo	☺
I.9	Valorização de zonas húmidas	Câmara Municipal de Viana do Castelo	Câmara Municipal de Viana do Castelo	350 000€	125 000€	-64	Município de Viana do Castelo	☺
I.10	Requalificação de passadiços	Câmaras Municipais de Caminha, Ponte de Lima, Viana do Castelo	Câmaras Municipais de Caminha, Ponte de Lima, Viana do Castelo	537 450€	566 068€	5	Municípios de Caminha (C) (ao longo da faixa litoral, entre Caminha e Âncora), Ponte de Lima (PL) e Viana do Castelo (VC)	☺
I.11	Museu Rural Ponte de Lima	Câmara Municipal de Ponte de Lima	Câmara Municipal de Ponte de Lima	250 000€	159 123€	-36	Município de Ponte de Lima	☺
I.12	Alvarinho Memória e Futuro	Câmara Municipal de Monção	Câmara Municipal de Monção	250 000 €	150 000€	-40	Município de Monção	☺



## Grau de execução física DETALHADO 2/6

#	NOME AÇÃO	PROMOTOR PREVISTO	PROMOTOR REAL	INVEST PREVISTO	INVEST REAL	DESVIO (%)	ÂMBITO TERRITORIAL REAL	GRAU DE EXECUÇÃO
I.13	Parque Micológico/ <u>Micobotânico</u> do Corno do Bico	Câmara Municipal de Paredes de Coura	Câmara Municipal de Paredes de Coura/Paisagem Protegida do Corno do Bico	220 000€	115 027€	-48	Município de Paredes de Coura	☹️
I.14	Economia solidária do campo ao prato	CIM Alto Minho	NA	191 000€	- €	0	NA	☹️
I.15	Terra versus Território	Câmara Municipal de Ponte de Lima	NA	150 000€	- €	0	NA	☹️
I.16	Sabores do Anho	Câmara Municipal de Valença	Câmara Municipal de Valença	150 000€	127 885€	-15	Município de Valença (Freguesia de Gondomil)	😊
I.17	Fórum Permanente Turismo Sustentável	CIM Alto Minho	CIM Alto Minho	12 500€	12 500€	0	Território CETS do Alto Minho	😊
I.18	Coordenação, implementação e monitorização da CETS	CIM Alto Minho	CIM Alto Minho	45 000€	50 000€	11	Território CETS do Alto Minho	😊
I.19	Reavaliação da CETS	CIM Alto Minho	CIM Alto Minho	50 000€	46 000€	-8	Território CETS do Alto Minho	😊
II.20	II Fase da CETS – adesão dos empresários turísticos	Associação Parques Com Vida	CIM Alto Minho	16 500€	12 500€	-24	Território CETS do Alto Minho	😊
II.21	III Fase da CETS - adesão de agências de viagens e operadores turísticos	Associação Parques Com Vida	NA	26 000 €	- €	0	NA	☹️
II.22	Marca NATURAL.PT	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas	33 000€	33 000€	0	Territórios CETS da Região Norte	😊
II.23	Aldeias de Portugal	Associação de Turismo de Aldeia	NA	90 000€	- €	0	NA	☹️
II.24	Disseminação da marca PCV do Alto Minho	Associação Parques com Vida	NA	42 462 €	- €	0	NA	☹️
II.25	Estratégia Comunicação Do Turismo Natureza Na Região Norte	Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.	NA	2 425€	- €	0	NA	☹️



## Grau de execução física DETALHADO 3/6

#	NOME AÇÃO	PROMOTOR PREVISTO	PROMOTOR REAL	INVEST PREVISTO	INVEST REAL	DESVIO (%)	ÂMBITO TERRITORIAL REAL	GRAU DE EXECUÇÃO
II.26	Promoção e informação turística do Norte Natural	Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.	NA	70 000€	- €	0	NA	☹
II.27	Norte Natural – Fam & Press trips	Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.	NA	17 000€	- €	0	NA	☹
II.28	Norte Natural em feiras de turismo	Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.	Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.	90 000€	DND	0	Região Norte	😊😊
II.29	Norte Natural - Topas & Roadshows	Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.	NA	90 000€	- €	0	NA	☹
II.30	Plano de Marketing para o Alto Minho	CIM Alto Minho	CIM Alto Minho	350 000€	200 000€	-43	Território CETS do Alto Minho	😊😊
III.31	Voluntariado ambiental no Norte Natural	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e Câmara Municipal de Viana do Castelo	NA	50 000€	- €	0	NA	☹
III.32	Voluntariado ambiental local	Câmara Municipal de Viana do Castelo	Câmara Municipal de Viana do Castelo	25 000€	3 000€	-88	Município de Viana do Castelo	😊
III.33	Carta de Desporto e Atividades Ao Ar Livre	CIM Alto Minho	NA	140 000€	- €	0	NA	☹
III.34	Rede Natura 2000 no Alto Minho	CIM Alto Minho	CIM Alto Minho	450 000€	230 000€	-49	Território CETS do Alto Minho	☹😊
III.35	Valorização da Paisagem do Alto Minho	CIM Alto Minho	CIM Alto Minho	325 000€	300 000€	-8	Território CETS do Alto Minho	😊😊
III.36	Alojamento local	Câmara Municipal de Caminha	NA	18 080€	- €	0	NA	☹
III.37	Segurança ativa	CIM Alto Minho	NA	55 000€	- €	0	NA	☹
III.38	Educação ambiental nos Territórios CETS	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas	NA	14 000€	- €	0	NA	☹
III.39	Educação ambiental no Alto Minho	Câmaras Municipais de Caminha, Monção, Paredes de Coura, Ponte	Câmaras Municipais de Caminha, Monção, Paredes de Coura, Ponte de Lima, Viana do	757 472 €	210 550€	-72	Municípios de Caminha (C), Monção (M), Paredes de Coura (PC), Ponte de Lima (PL), Viana do	😊😊



## Grau de execução física DETALHADO 4/6

#	NOME AÇÃO	PROMOTOR PREVISTO	PROMOTOR REAL	INVEST PREVISTO	INVEST REAL	DESVIO (%)	ÂMBITO TERRITORIAL REAL	GRAU DE EXECUÇÃO
		de Lima, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira	Castelo, Vila Nova de Cerveira				Castelo (VC) e Vila Nova de Cerveira (VNC)	
III.40	Sessões de esclarecimento PDR 2020	ADRIL – Assoc. Desenv. Rural Integrado do Lima e ADRIMINHO – Assoc. Desenv. Rural Integrado do Vale do Minho	ADRIL – Assoc. Desenv. Rural Integrado do Lima e ADRIMINHO – Assoc. Desenv. Rural Integrado do Vale do Minho	2 000 €	DND	0	Território CETS do Alto Minho	😊
III.41	Barómetro do Turismo de Natureza na Região Norte	Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.	NA	26 400€	- €	0	NA	😞
III.42	Sensibilização e divulgação CETS nos media	Alto Minho TV	NA	48 500 €	- €	0	NA	😞
III.43	Redes de cooperação CET	CIM Alto Minho	CIM Alto Minho	30 000€	18 204€	-39	Território CETS do Alto Minho	😞😞
IV.44	Via Norte Natural - estradas cénicas do Norte Natural	Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.	NA	136 000€	- €	0	NA	😞
IV.45	SIGATUR - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Turísticas	Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro	NA	48 000€	- €	0	NA	😞
IV.46	Turismo Religioso	Pastoral do Turismo da Diocese de Bragança	NA	24 400€	- €	0	NA	😞
IV.47	Caminho Português da Costa	Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira	Câmaras Municipais de Vila Nova de Cerveira e Caminha	323 400€	341 850€	6	Municípios de Caminha (C) e Vila Nova de Cerveira (VNC)	😊
IV.48	Percurso Interpretativo Rio Coura	Câmara Municipal de Paredes de Coura	Câmara Municipal de Paredes de Coura	1 200 000€	380 122€	-68	Município de Paredes de Coura	😊😊
IV.49	Rotas do Património de Vila Nova de Cerveira	Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira	Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira	320 200€	244 000€	-24	Município de Vila Nova de Cerveira	😊😊
IV.50	Garfo Verde	Câmaras Municipais de Caminha, Monção, Paredes de Coura, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira	Câmaras Municipais de Viana do Castelo e de Paredes de Coura	437 500€	262 726€	-40	Municípios de Viana do Castelo (VC) e Paredes de Coura (PC)	😞😊



## Grau de execução física DETALHADO 5/6

#	NOME AÇÃO	PROMOTOR PREVISTO	PROMOTOR REAL	INVEST PREVISTO	INVEST REAL	DESVIO (%)	ÂMBITO TERRITORIAL REAL	GRAU DE EXECUÇÃO
IV.51	Caldo Verde – 7 Maravilhas da Gastronomia Portuguesa	ADIRIMINHO – <u>Assoc. Desen.</u> Rural Integrado do Vale do Minho	NA	60 000€	- €	0	NA	☹
IV.52	Campismo e caravanismo no Alto Minho	Câmaras Municipais de Paredes de Coura e Ponte de Lima	Câmaras Municipais de Paredes de Coura e Ponte de Lima	3 650 000€	89 888€	-98	Municípios de Paredes de Coura e Ponte de Lima	☹☹
IV.53	Grande Caminho do Norte Natural - GR Norte Natura	Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.	NA	180 000€	- €	0	NA	☹
IV.54	CICLONORTENATURAL - Grande Rota de Cicloturismo do Norte Natural	Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.	NA	180 000€	- €	0	NA	☹
IV.55	Grande Rota Pedestre e Cicloturismo do Alto Minho	CIM Alto Minho	CIM Alto Minho	3 465 000 €	897 171€	-74	Território CETS do Alto Minho	☹☹
IV.56	Rede Secundária de Percursos Pedestres	Câmaras Municipais de Paredes de Coura, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira	Câmaras Municipais de Paredes de Coura, Ponte de Lima, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira	641 185 €	723 453€	13	Municípios de Paredes de Coura (PC), Ponte de Lima (PL) e Viana do Castelo (VC)	☺☺
IV.57	BTTNORTENATURAL - Grande Rota de BTT do Norte Natural	Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.	NA	180 000€	- €	0	NA	☹
IV.58	Centro de BTT do Corno de Bico	Câmara Municipal de Paredes de Coura	Câmara Municipal de Paredes de Coura	500 000€	1 388 200€	178	Município de Paredes de Coura	☺
IV.59	Zona concessionada de pesca lúdica	Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira	Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira	10 000€	15 000€	50	Município de Vila Nova de Cerveira	☹☹
IV.60	Organização, valorização e promoção das atividades de rio	Consórcio <u>MinhoIN</u> . Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e ADERE-Peneda Gerês	CIM Alto Minho	385 000 €	48 000€	-88	Território CETS do Alto Minho	☹☹
IV.61	Valorização da oferta de produtos “Mar & Rio”	CIM Alto Minho	CIM Alto Minho	1 000 000€	887 208€	-11	Território CETS do Alto Minho	☹☺
IV.62	Turismo náutico Cerveira Rios Minho e Coura	Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira	Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira	202 500€	538 113 €	166	Município de Vila Nova de Cerveira	☺







## Grau de execução física DETALHADO 6/6

#	NOME AÇÃO	PROMOTOR PREVISTO	PROMOTOR REAL	INVEST PREVISTO	INVEST REAL	DESVIO (%)	ÂMBITO TERRITORIAL REAL	GRAU DE EXECUÇÃO
IV.63	Programação cultural do Alto Minho	CIM Alto Minho	CIM Alto Minho	18 500€	2 869 743€	15 412	Território CETS do Alto Minho e municípios de Arcos de Valdevez, Melgaço e Ponte da Barca	😊
IV.64	<u>Folkmonção</u> - O Mundo a Dançar	Rancho Folclórico da Casa do Povo de Barbeita	Rancho Folclórico da Casa do Povo de Barbeita	325 000€	325 000€	0	Território CETS do Alto Minho	😊
IV.65	Um rio com sabores	ADRMINHO – Assoc. <u>Desenv.Rural Integrado do Vale do Minho e Câmaras Municipais de Valença e Vila Nova de Cerveira</u>	ADRMINHO - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho e Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira	160 000 €	523 466€	227	Municípios de Caminha, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira	😐😊
IV.66	Monção, cultura e tradição	Câmara Municipal de Monção	Câmara Municipal de Monção	1 006 985€	1 006 985€	0	Município de Monção	😊
IV.67	Ponte de Lima, cultura e tradição	Câmara Municipal de Ponte de Lima, Associação Concelhia das Feiras Novas e <u>AncorEventos</u>	Câmara Municipal de Ponte de Lima, Associação Concelhia das Feiras Novas e <u>AncorEventos</u>	3 500 000€	2 800 000€	-20	Município de Ponte de Lima	😊
IV.68	Vila Nova de Cerveira, cultura e tradição	Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira	Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira	1 520 500€	1 520 500€	0	Município de Vila Nova de Cerveira	😊
IV.69	Caminha, cultura e tradição	Câmara Municipal de Caminha	Câmara Municipal de Caminha	1 300 000€	946 161€	-27	Município de Caminha	😊
IV.70	<u>Enogastronomia</u>	Câmara Municipal de Viana do Castelo	Câmara Municipal de Viana do Castelo	419 450€	310 956€	-26	Município de Viana do Castelo	😐😊
IV.71	<u>Ytravel</u> Caminha	Câmara Municipal de Caminha	NA	25 500 €	- €	0	NA	😞
				<b>28 595 519 €</b>	<b>21 943 917 €</b>	<b>-23</b>		



# Grau de execução física POR PROMOTOR

ENTIDADE	ANI ☹		AI ☹☹		AA ☺☺		AF ☺		GRAU EXECUÇÃO GLOBAL
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	%
Comunidade Intermunicipal do Alto Minho	3	17	5	28	4	22	6	33	57
Câmara Municipal de Caminha	2	29	0	-	1	14	4	57	67
Câmara Municipal de Monção	0	-	0	-	1	33	2	67	89
Câmara Municipal de Paredes de Coura	0	-	4	50	3	38	1	13	54
Câmara Municipal de Ponte de Lima	1	11	1	11	3	33	4	44	70
Câmara Municipal de Valença	0	-	0	-	1	100	0	-	66
Câmara Municipal de Viana do Castelo	2	15	2	15	3	23	6	46	66
Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira	0	-	1	13	4	50	3	38	75
ICNF	2	67	0	-	0	-	1	33	33
Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.	9	90	0	-	1	10	0	-	7
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro	1	100	0	-	0	-	0	-	0
ADRIL	0	-	0	-	0	-	1	100	100
ADRMINHO	1	33	0	-	1	33	1	33	55
Alto Minho TV	1	100	0	-	0	-	0	-	0
AncorEventos	0	-	0	-	0	-	1	100	100
Associação Concelhia das Feiras Novas	0	-	0	-	0	-	1	100	100
Associação de Turismo de Aldeia	1	100	0	-	0	-	0	-	0
Associação Parques Com Vida	2	100	0	-	0	-	0	-	0
Pastoral do Turismo da Diocese de Bragança	1	100	0	-	0	-	0	-	0
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Barbeita	0	-	0	-	0	-	1	100	100

	Grau de execução das ações de 100%
	Grau de execução acima de 50%
	Grau de execução abaixo de 50%
	Grau de execução nulo





## Grau de execução física **PRINCIPAIS CONCLUSÕES**

- **32%** das ações foram **executadas na sua totalidade**;
- **17%** das ações encontram-se em **estado avançado de execução (>50%)**;
- **15%** das ações tiveram **menos de 50% de execução**;
- **35%** das ações, que representam a maioria, **não foram iniciadas** por:
  - Falta de financiamento/aprovação de candidaturas;
  - Falta de meios humanos disponíveis;
  - Inexistência de secretariado técnico responsável pela animação, coordenação e acompanhamento da execução PA;
  - O grande nº promotores/ações tornou a execução do Plano de Ação mais complexo, difícil de animar e acompanhar;
  - Ausência de dinâmica institucional dos promotores das ações regionais das CETS Norte (TPNP, ICNF, UTAD e APCV);
  - Falta de articulação e trabalho em rede entre os municípios;
  - Outras dificuldades de natureza legal.



## Grau de execução financeira POR PROMOTOR

ENTIDADE	INVESTIMENTO PREVISTO 2015-2019	INVESTIMENTO REAL 2015-2019 (+2020)	DESVIO (%)
Comunidade Intermunicipal do Alto Minho	7 360 334 €	8 482 960 €	15
Câmara Municipal de Caminha	1 551 080 €	1 214 204 €	-22
Câmara Municipal de Monção	1 325 957 €	1 156 985 €	-13
Câmara Municipal de Paredes de Coura	2 887 500 €	2 190 297 €	-24
Câmara Municipal de Ponte de Lima	5 454 167 €	3 709 427 €	-32
Câmara Municipal de Valença	457 500 €	127 885 €	-72
Câmara Municipal de Viana do Castelo	2 372 660 €	1 228 857 €	-48
Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira	2 794 635 €	3 475 302 €	24
Consórcio MinhoIN	128 334 €	0 €	-100
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas	72 000 €	33 000 €	-54
Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.	971 825 €	0 €	-100
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro	48 000 €	0 €	-100
ADERE-Peneda Gerês	128 334 €	0 €	-100
ADRIL – Assoc. Desenv. Rural Integrado do Lima	1 000 €	DND	-
ADRIMINHO – Assoc. Desenv. Rural Integrado do Vale do Minho	136 000 €	DND*	-
Alto Minho TV	48 500 €	0 €	-100
AncorEventos	1 166 665 €	DND*	-
Associação Concelhia das Feiras Novas	1 166 665 €	DND*	-
Associação de Turismo de Aldeia	90 000 €	0 €	-100
Associação Parques Com Vida	84 962 €	0 €	-100
Pastoral do Turismo da Diocese de Bragança	24 400 €	0 €	-100
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Barbeita	325 000 €	325 000 €	0
<b>INVESTIMENTO TOTAL PA</b>	<b>28 595 519 €</b>	<b>21 943 917 €</b>	<b>-23</b>



## Grau de execução financeira PRINCIPAIS CONCLUSÕES

- **26** das 71 ações apresentam um **desvio negativo** entre o investimento previsto e o real;
- **10 ações** apresentam um **desvio positivo** entre o investimento previsto e o real;
- Apenas **5 ações não apresentaram qualquer desvio** entre o investimento previsto e o real;
- **Mais de metade (56%) do total de investimento do PA está concentrado em 6 ações** (I.1 Mobilidade e acessibilidade universal, IV.58 Centro de BTT do Corno de Bico, IV.63 - Programação cultural do Alto Minho, IV.66 Monção, cultura e tradição, IV.67 Ponte de Lima, cultura e tradição, IV.68 Vila Nova de Cerveira, cultura e tradição);
- O **investimento total** realizado no território CETS do Alto Minho no âmbito do Plano de Ação 2015-2019 (+2020) foi de **21 943 917 €**



## Ações executadas não previstas no PA

#	NOME AÇÃO	PROMOTOR	PRAZO EXECUÇÃO	INVESTIMENTO	ÂMBITO TERRITORIAL
I.72	Geoparque Litoral de Viana do Castelo	Câmara Municipal de Viana do Castelo	2016-2020	700 000 €	Município de Viana do Castelo
I.73	O Lobo e Homem: Proteger, Valorizar e Sensibilizar	Município de Paredes de Coura, CIBIO, Freguesia de Castanheira	2016-2020	160 626 €	Municípios de Paredes de Coura, Arcos de Valdevez, Ponte Lima e Valença
III.74	Guia para a promoção do Turismo	Eurocidade Cerveira Tomiño	2019-2020	13 000 €	Vila Nova de Cerveira e Tomiño
IV.75	Percursos do Homem e do Garrano	Câmara Municipal de Viana do Castelo	2017-2019	150 692 €	Município de Viana do Castelo
IV.76	App Turismo Acessível	Eurocidade Cerveira Tomiño	2019-2020	7 000 €	Vila Nova de Cerveira e Tomiño
				<b>1 031 318 €</b>	

**Foram executadas 5 ações, as quais representam um investimento total de 1 031 318 €**

**No total investiram-se 22 975 235 € (3,8 milhões €/ano)**



## Recomendações da auditora (2015)

- 1. Definir novas ações específicas ou identificar e estruturar as atuais atividades turísticas, onde a natureza não tem apenas valor paisagístico mas é considerada um valor por si*
- 2. Fazer um esforço para convidar PME especializadas em turismo de natureza para o Fórum Permanente de Turismo Sustentável*
- 3. Harmonizar as marcas associadas ao setor turístico*
- 4. Envolver os postos de turismo dos centros das cidades na CETS*
- 5. Dinamizar a informação sobre infraestruturas e serviços turísticos acessíveis*



## Recomendações da PN para o próximo PA (1/2)

- Estabelecer o modelo de gestão e implementação da CETS, garantindo uma **capacidade de Secretariado Técnico para a animação, coordenação e monitorização em dedicação exclusiva**, essencial ao seu sucesso de uma forma clara, inequívoca e com os meios humanos e financeiros suficientes;
- Procurar um **envolvimento mais ativo dos municípios, principais parceiros da CETS do Alto Minho**, fazendo da Estratégia e respetivo Plano de Ação da CETS um documento de referência para a priorização do investimento público no setor do turismo de natureza;
- **Desenvolver Grupos de Trabalho Temáticos** para melhorar o trabalho em rede entre municípios e parceiros privados, essencial à implementação das ações no Alto Minho;




## Recomendações para o próximo PA (2/2)


- Dinamizar uma **aproximação estratégica entre as CETS do AM e do PNPG** como territórios da mesma CIM e garantir maior envolvimento institucional das entidades com competências na área do turismo na implementação destas CETS;
- Ter em consideração a **coerência e o grau de resposta das ações** que integram o Plano de Ação, aos objetivos gerais e específicos definidos na **Estratégia de Desenvolvimento Turístico Sustentável**;
- **Ser mais realista**, evitando um número excessivo de promotores, de ações e de valor de investimento, identificando as ações prioritárias estruturantes, claramente associadas à sustentabilidade e ao Turismo Natureza, concentrando os esforços de implementação;
- Procurar que o **Plano de Ação não seja um somatório de ações de caráter municipal**, mas antes integre as ações de caráter territorial Alto Minho, promovendo o trabalho em rede em todas as áreas de atuação.



# Debate

Durante o debate, gostaríamos de contar com a sua participação.

- **Intervenção:** levante a mão virtual  para pedir para falar e aguarde as instruções do moderador.
- **Chat:** Escreva a sua pergunta no Cisco Webex® Bato-papo. O moderador fará uma seleção entre todas as perguntas feitas.

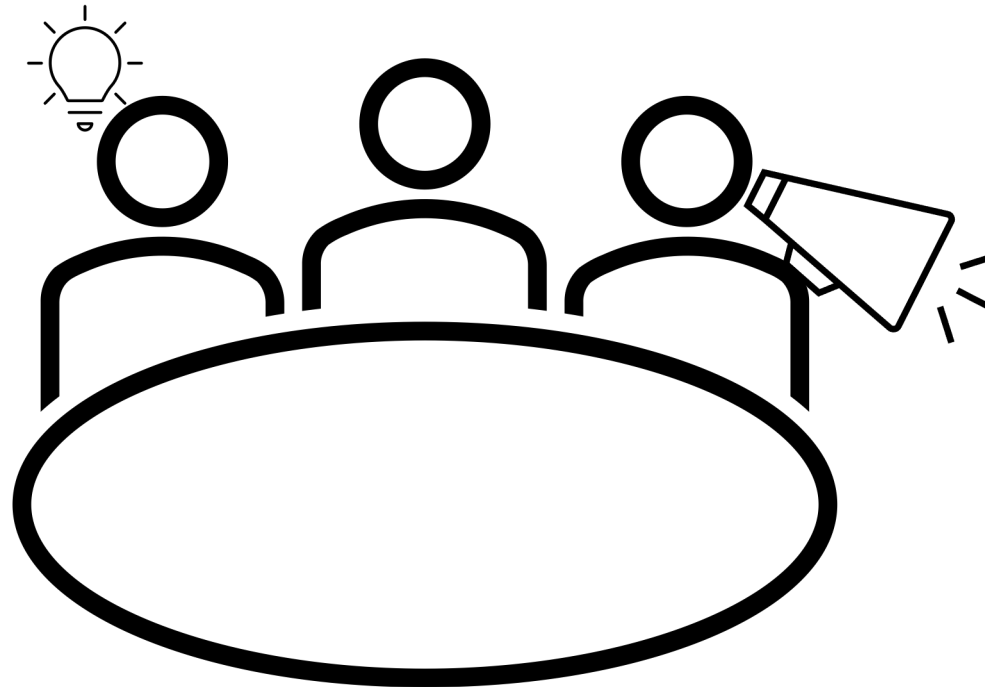





**EUROPARC**  
Turismo Sustentável  
em Áreas Protegidas

**ALTO  
MINHO**  
CARTA EUROPEIA DE TURISMO SUSTENTÁVEL

# Pausa



*-Estamos de volta em 15 minutos -*



**EUROPARC**  
Turismo Sustentável  
em Áreas Protegidas

**ALTO  
MINHO**  
CARTA EUROPEIA DE TURISMO SUSTENTÁVEL

# Sessão Plenária

**Constituição dos grupos de trabalho e explicação da metodologia de trabalho para a “*validação das ofertas para o Turismo de Natureza do Alto Minho no anterior PA (2015-2019)*”**

*Paulo Castro, Ponto Natura*



# Sessões Paralelas de Grupos de Trabalho Temáticos

- Cada grupo irá reunir virtualmente em salas diferentes durante uma hora

**GRUPO 1: Institucionais**

Animador: Paulo Castro

Relator: Sandra Estevens

**GRUPO 2: Alojamento,  
Restauração e Pontos venda**

Animador: Goretti Silva

Relator: Alexandra Nogueira

**GRUPO 3: EAT, CEA, AVT  
e Transportes**


Animador: Marina Carvalho

Relator: Filipa Lima

**Objetivo: Apresentar, discutir e validar as ofertas turísticas da nova Estratégia e Plano de Ação para o próximo PA 2021-2024**



# 1. Validação das Ofertas turísticas do anterior PA 2015-2019 pela ETP RESULTADOS

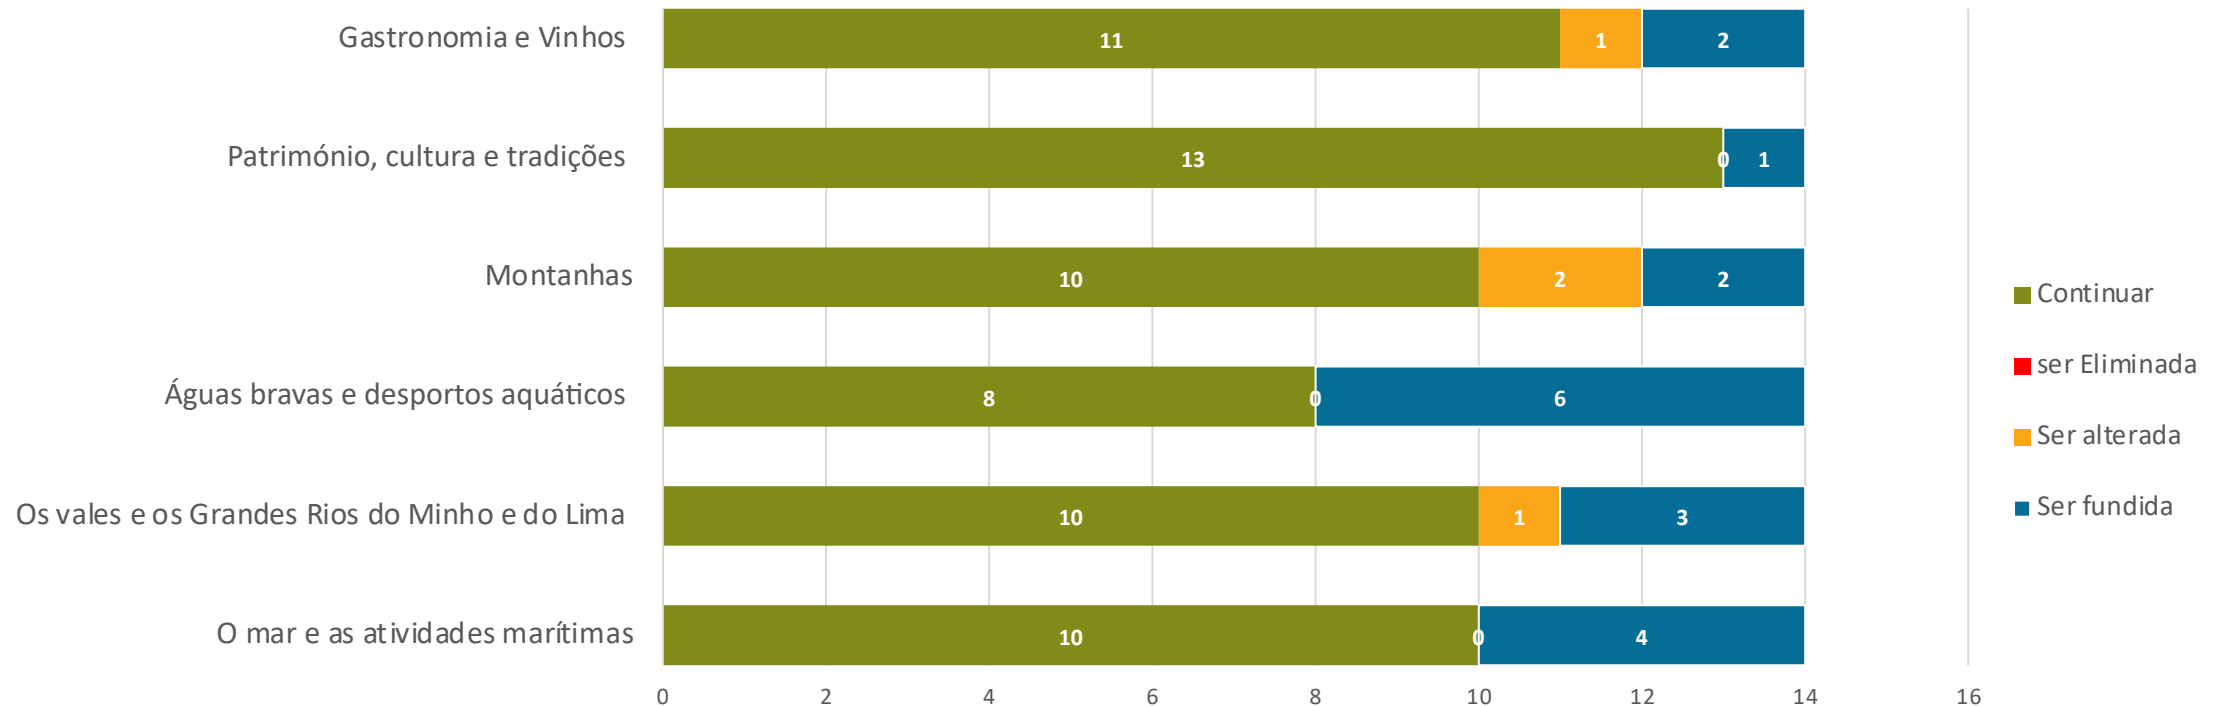



# 1. Validação das Ofertas turísticas do anterior PA pela ETP **PRINCIPAIS ALTERAÇÕES PROPOSTAS**

- “**Montanhas**” e “**Os Vales e os Grandes rios do Minho e do Lima**” foram **eliminadas** pela natureza geográfica enquanto as restantes são funcionais;
- Faz-se a fusão das “**Águas bravas e Desportos náuticos**” com “**o Mar e as Atividades marítimas**” pela sua afinidade e existência das iniciativas “Estação Náutica do Alto Minho” e “Blueways”;
- **Integram-se** as duas ofertas sugeridas pela ETP, “**Walking & Cycling**” e “**Caminho Português de Santiago**”;
- Alterou-se designação da oferta “**Património**”.



# 1. Validação das Ofertas turísticas apresentadas no PA 2015-2019 (+2020) PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

As ofertas para a próxima Estratégia & Objetivos da CETS AM passam a ser:

## 6 ofertas diferenciadoras 2015-2020

1. O mar e as atividades marítimas
2. Os vales dos Rios Minho e Lima
3. Águas Bravas e desportos aquáticos
4. Montanhas
5. Património, cultura e tradições
6. Gastronomia e vinhos



## 5 ofertas diferenciadoras 2021-2024

1. Gastronomia e vinhos
2. Património, identidade cultural e eventos "ECO"
3. Alto Minho Greenways (walking & cycling)
4. Caminhos de Santiago\*
5. Alto Minho Blueways e Estação Náutica do Alto Minho


\*(Caminho Português de Santiago (central), Caminho Português pela Costa, Caminho de Torres, Caminho Minhoto Ribeiro)



**EUROPARC**  
Turismo Sustentável  
em Áreas Protegidas

**ALTO  
MINHO**  
CARTA EUROPEIA DE TURISMO SUSTENTÁVEL

# Sessões Paralelas de Grupos de Trabalho Temáticos

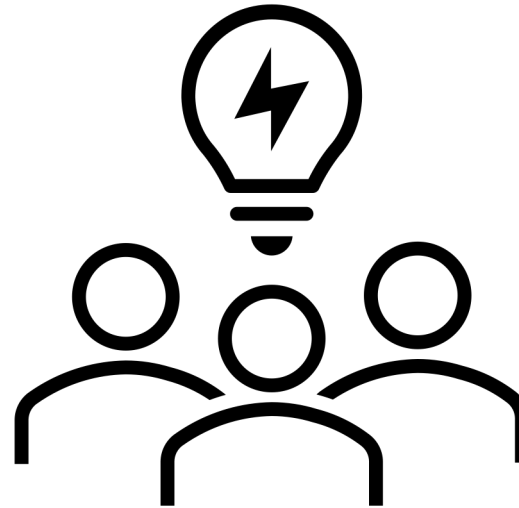


-Voltamos à sessão plenária em 60 minutos-



**EUROPARC**  
Turismo Sustentável  
em Áreas Protegidas

**ALTO  
MINHO**  
CARTA EUROPEIA DE TURISMO SUSTENTÁVEL

# Sessão Plenária

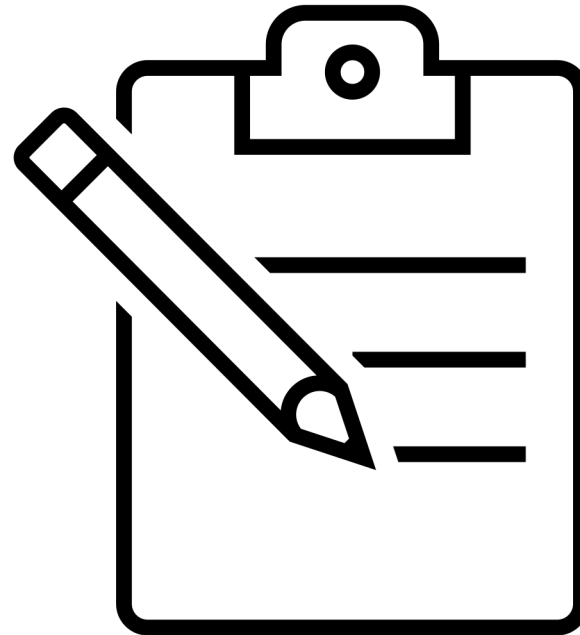

-Resumo do dia 1-



# CARTA EUROPEIA DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO ALTO MINHO

**OBRIGADA PELA VOSSA ATENÇÃO!  
ATÉ AMANHÃ!**

Paulo Castro, Consultor

**M:** Rua Amadeu Sousa Cardoso, nº6  
4750-175 Nogueira | Braga

**E:** paulo.castro@pontonatura.com | sofia.alves@pontonatura.com | ana.lima@pontonatura.com

**S:** [www.pontonatura.com](http://www.pontonatura.com)

**T:** (+351) 253685316 | (+351) 926227623



cim alto minho  
comunidade intermunicipal do minho-lima



EUROPARC  
Turismo Sustentável  
em Áreas Protegidas
